

# Test

# Certifikat

På Skydedør

Ordre nr: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Testet af: \_\_\_\_\_

Partiet er testet stående på en Palle og belastet med et koncentreret Vandtryk svarende til ca. 1kPa Hvor Vindues Industriens retningslinjer er 0,45 kPa

Partiet er fundet tæt under testen.


Dato: \_\_\_\_\_

Underskrevet: \_\_\_\_\_



Se testen på QR koden

Skydedøren skal monteres efter standard montage og enkelte punkter er meget vigtige og disse er anført her i denne ekstra vejledning.

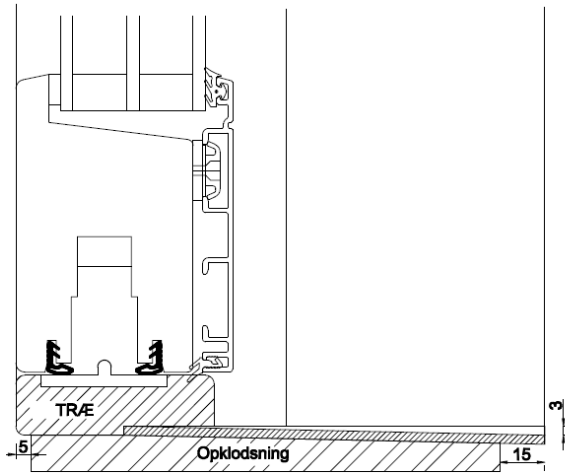

Opklodsning pr. 200 mm under hele bundkarmen. Der skal være opklodsning direkte under sidekarme og lodret post. Der skal sikres at hele bundkarmen er ret for korrekt tætning og funktion. Alubundtrinet skal have en svag hældning på ca. 3 mm nedad, så der sikres afledning af vand ud mod forkant.

**!! Hvis ikke disse vejledninger følges kan der opstå utætheder på døren!!**

Eller gennemgående opklodsning

